

工事だより vol.12

【現場の省力化】

工事だよりvol.12は造成現場の省力化についてご紹介いたします。「川口土地区画整理事業 基盤整備工事」では省力化した作業・業務を行っています。省力化することによって様々なメリットが生まれます。

施工日数の短縮

環境負荷の低減

業務の効率化

安全性の向上

本工事での、省力化した作業・業務をご紹介します。

【重機搭載レーザー計測システム】

重機に搭載したレーザー計測システムで、面積を計測することができます。重機のオペレーターは運転席から計測結果を見ることができます。また、職員による計測が省略でき、業務の効率化や安全性の向上につながります。



【マシンガイダンス】

バックホウの位置、刃先の位置をリアルタイムでモニタに表示するシステムです。作業に必要な情報が運転席のモニターに表示され、作業の効率化・安全性の向上が期待できます。

【GPS測量】

GPSを使用した測量を行っています。一人での短時間の測量が可能となります。


【安全工事打合せ書の電子化】

毎日作成している安全工事打合せ書を電子化しました。作成時間が短縮し、どこにいてもパソコンやスマートフォンで確認できるようになりました。

・航空写真



2年後

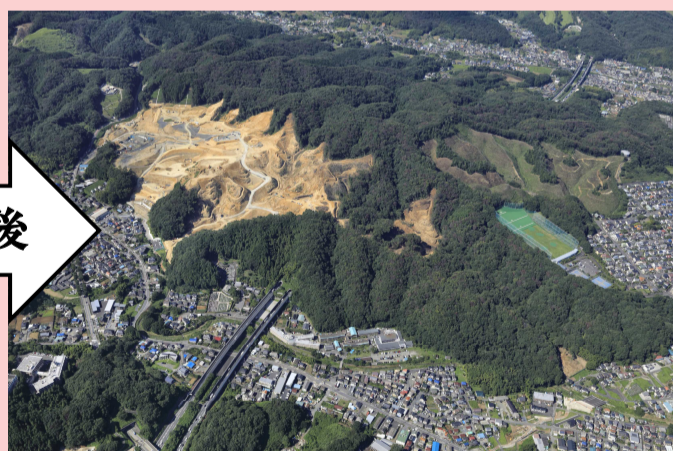

2020年8月撮影

2022年8月撮影

❄️ 休暇中の連絡先 ❄️

12月28日から1月4日まで冬季休暇を取らせていただきます。休暇中はガードマンによる巡回警備を行い不足の事態に対応いたします。期間中は事務所の電話を祖父江携帯に転送しますので何かありましたら連絡をお願いします。

連絡先:042-652-1071

・工事予定表 10月～12月

	10月											11月											12月																								
	1	2	3	7	8	9	10	15	16	17	22	23	24	29	30	31	1	5	6	7	11	12	13	14	19	20	21	26	27	28	30	1	3	4	5	9	10	11	12	17	18	19	24	25	26	27	28
No.1ゲート	土工事、排水工事、急傾斜地対策																																														
No.2ゲート	防災工事、土工事																																														
No.3ゲート	伐採、土工事、防災工事																																														

12月28日～1月4日
冬季休暇

* 日曜日、第2土曜日を作業所閉所といたします。

休工日
